



CRONOPROGRAMMA			
LAVORAZIONE	INIZIO	FINE	N. GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA			
installazione cantiere	31/08/15	31/08/15	1
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso	01/09/15	03/09/15	3
sistemazione in quota pozzetti	04/09/15	06/09/15	3
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del nuovo manto stradale	07/09/15	09/09/15	3
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della pavimentazione stradale	10/09/15	13/09/15	4
smobilizzo cantiere	14/09/15	14/09/15	1
VIA LAZIO			
installazione cantiere	15/09/15	15/09/15	1
rasatura zanelle	16/09/15	20/09/15	5
scavo per formazione nuova massicciata nel tratto avvallato	21/09/15	21/09/15	1
formazione di nuova massicciata stradale nel tratto avvallato	22/09/15	25/09/15	4
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso	26/09/15	29/09/15	4
sistemazione in quota pozzetti	30/09/15	02/10/15	3
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del nuovo manto stradale	03/10/15	06/10/15	4
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della pavimentazione stradale	07/10/15	09/10/15	3
smobilizzo cantiere	10/10/15	10/10/15	1
P.LE MAGNALBO'			
Installazione cantiere	11/10/15	12/10/15	2
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso	13/10/15	14/10/15	2
sistemazione in quota pozzetti	15/10/15	16/10/15	2
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della pavimentazione stradale	17/10/15	19/10/15	3
smobilizzo cantiere	20/10/15	20/10/15	1
F.LLI CERVI - VIA LOMBARDIA			
Installazione cantiere	21/10/15	21/10/15	1
rasatura zanelle	22/10/15	23/10/15	2
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso	24/10/15	25/10/15	2
sistemazione in quota pozzetti	26/10/15	27/10/15	2
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del nuovo manto stradale	28/10/15	30/10/15	3
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della pavimentazione stradale	31/10/15	02/11/15	3
smobilizzo cantiere	03/11/15	03/11/15	1
TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI			65

FASE 1




FASE 2

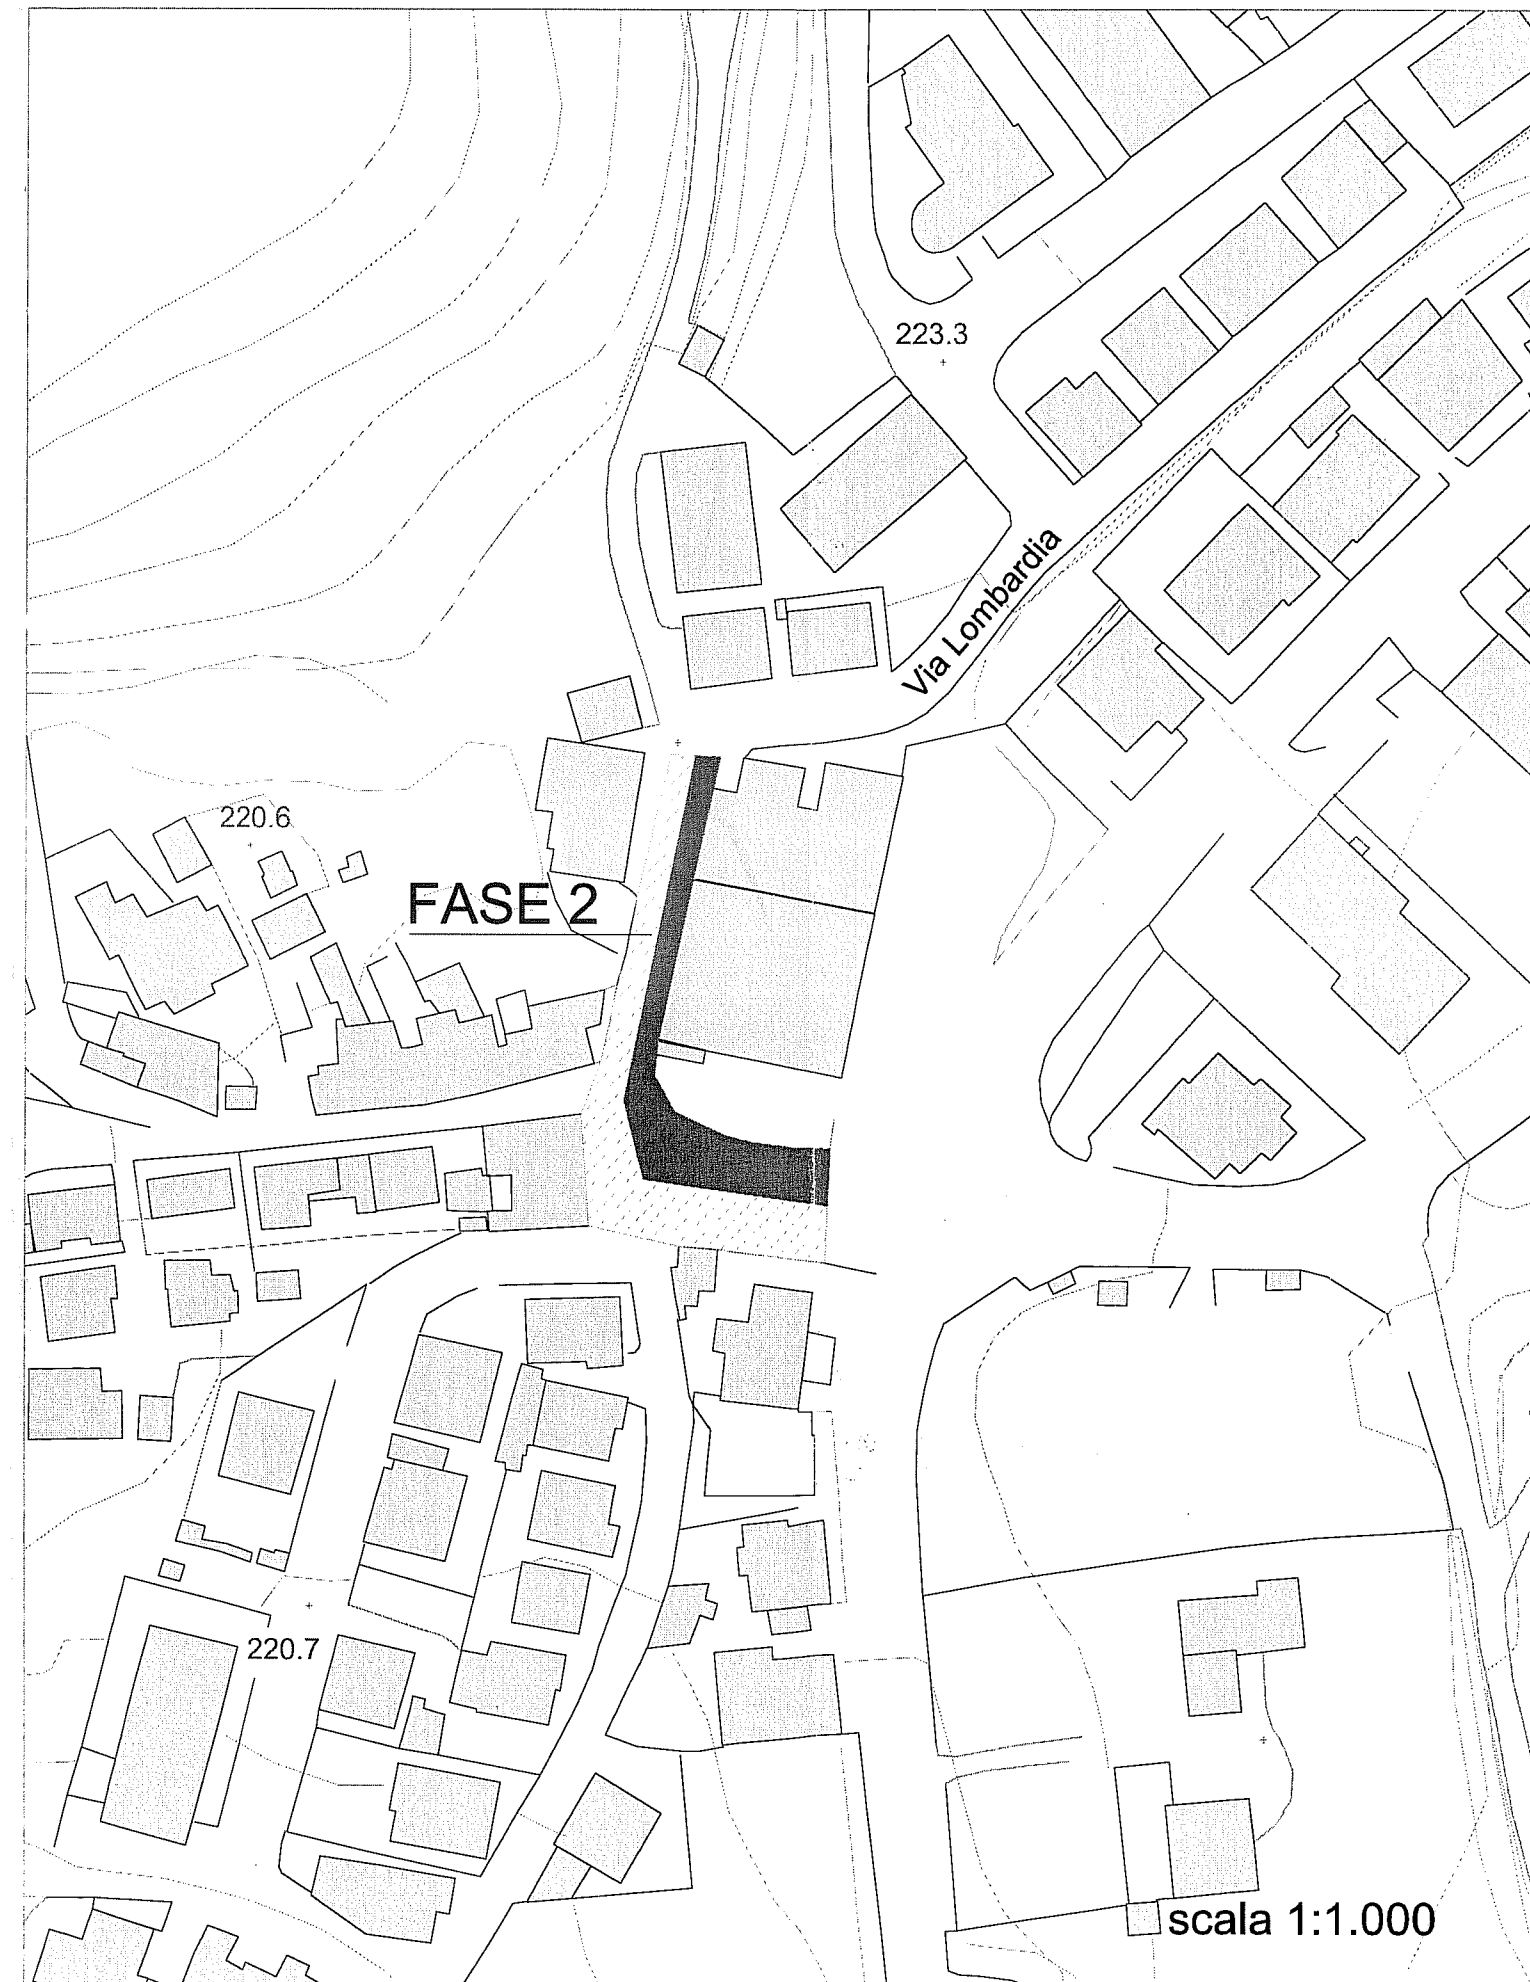

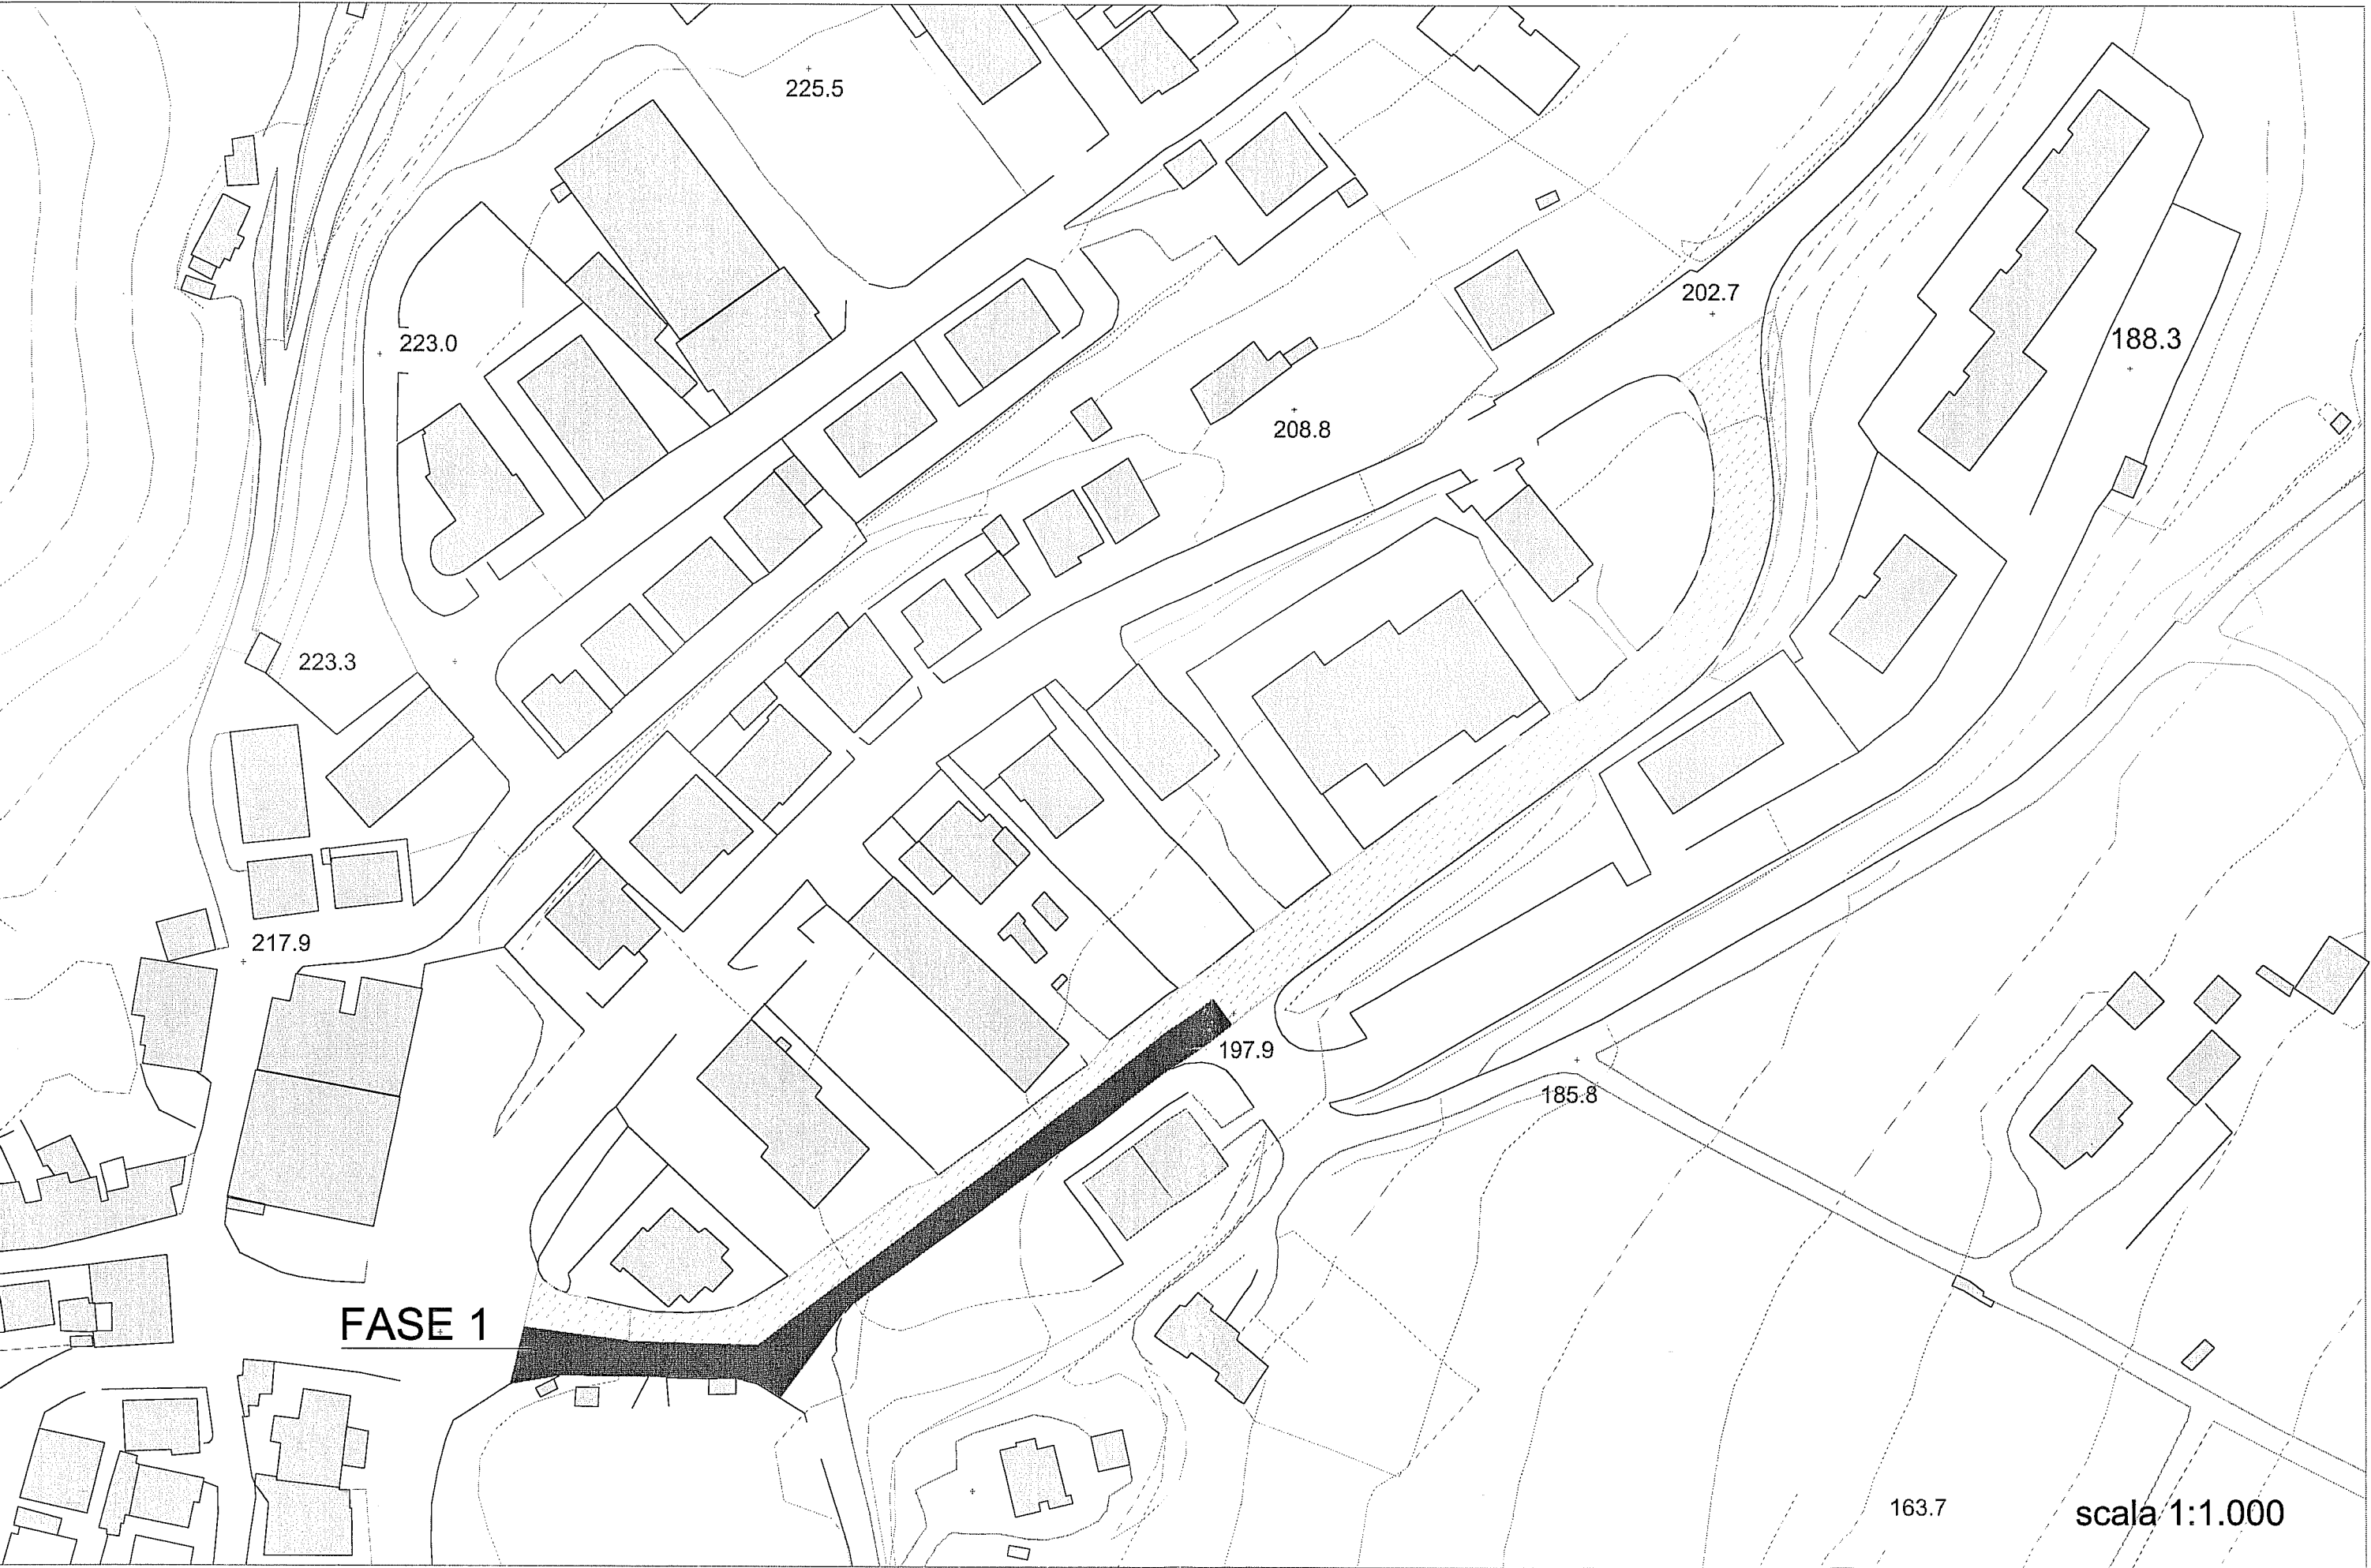

FASE 1


scala 1:1.000

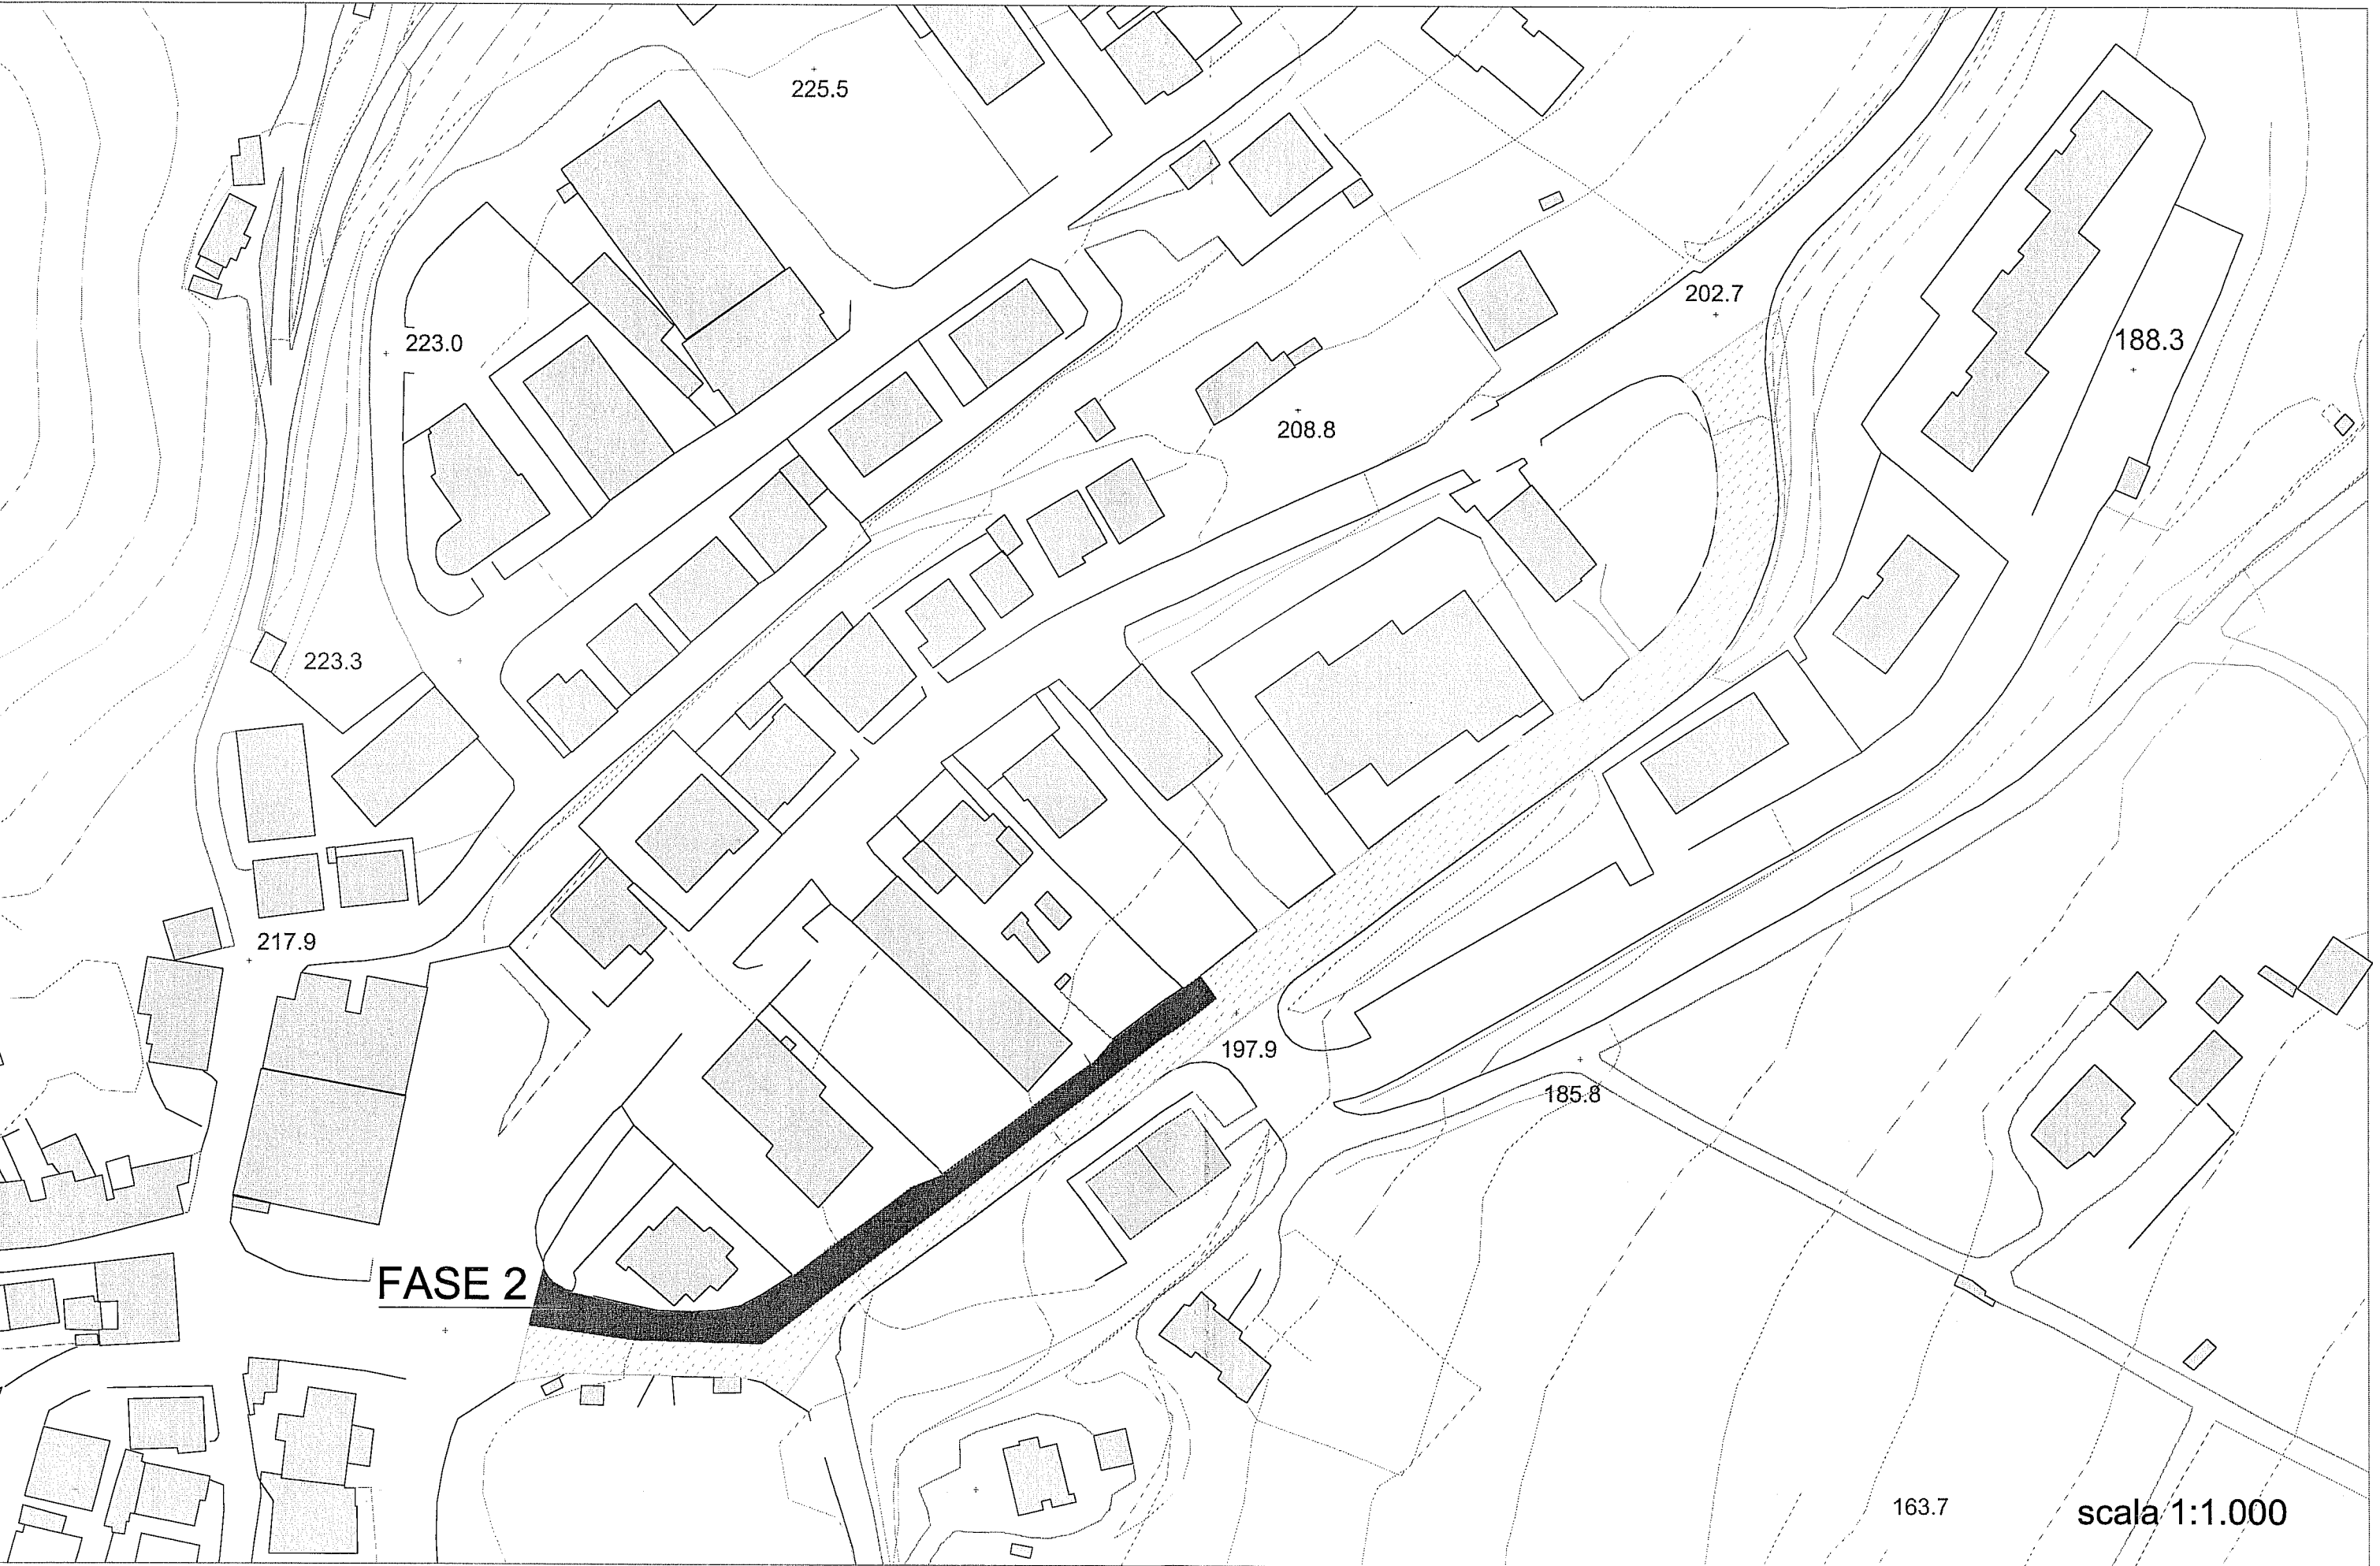


FASE 2

scala 1:1.000


FASE 3

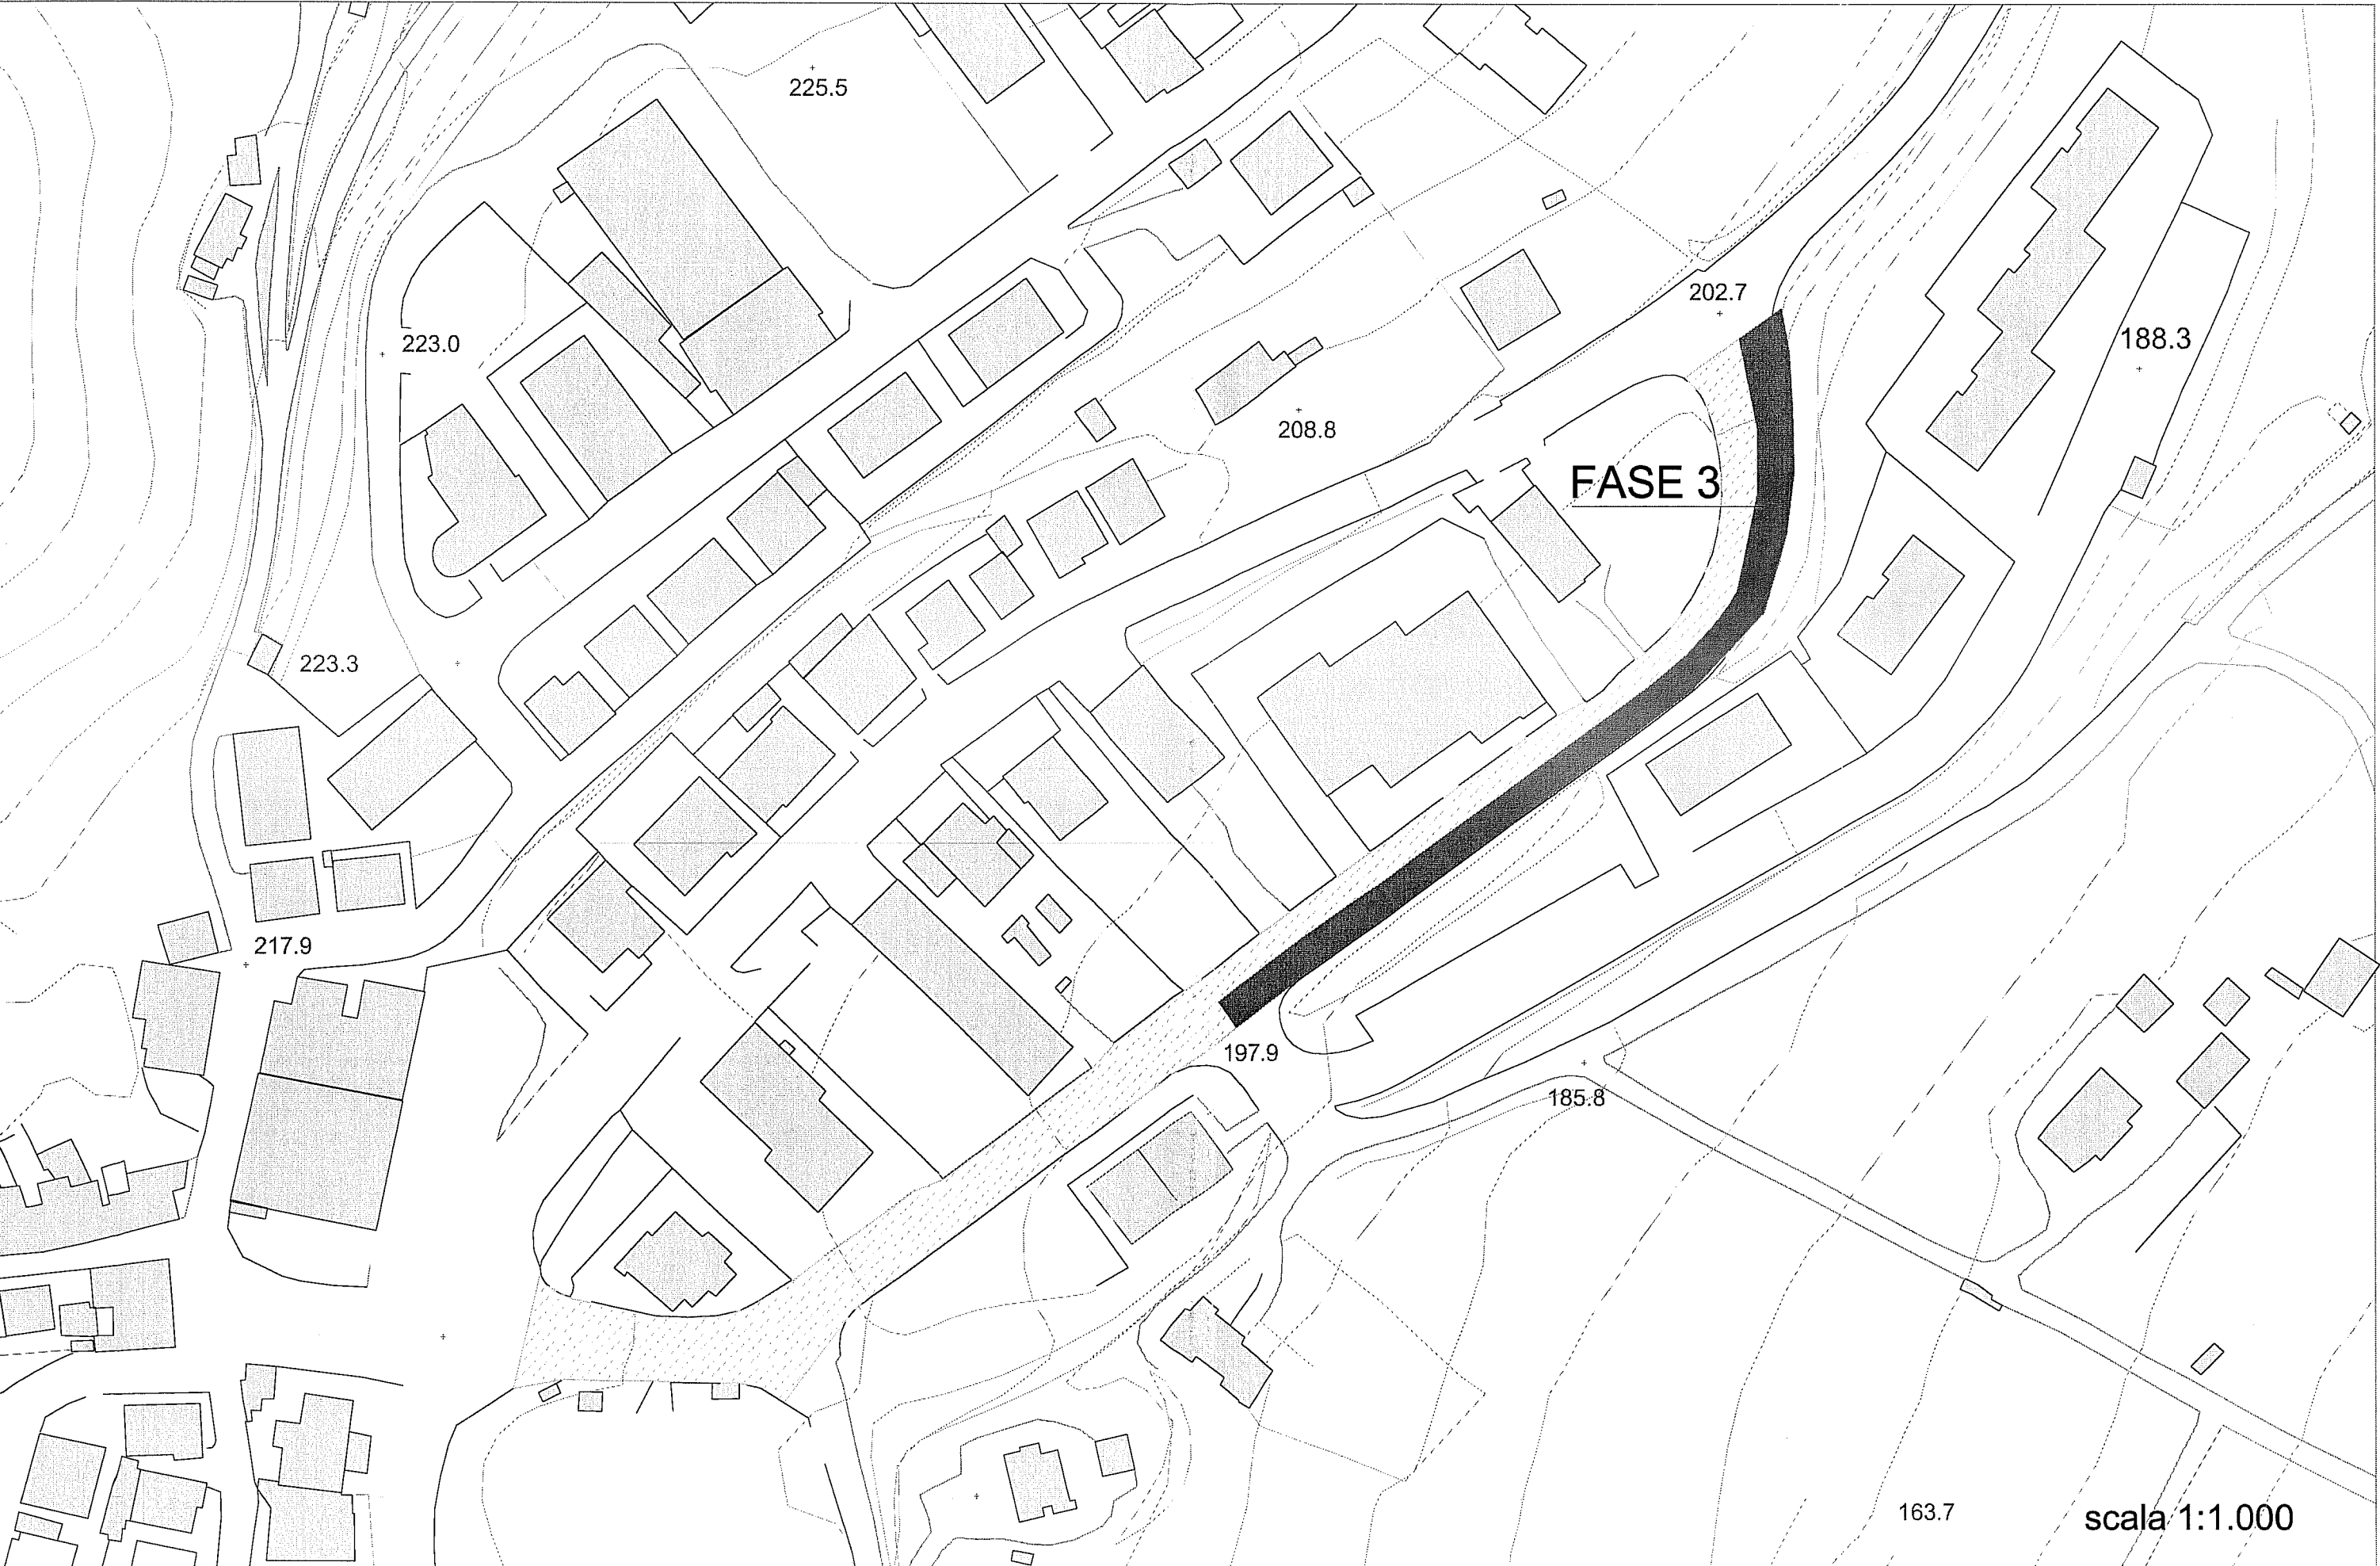


scala 1:1.000

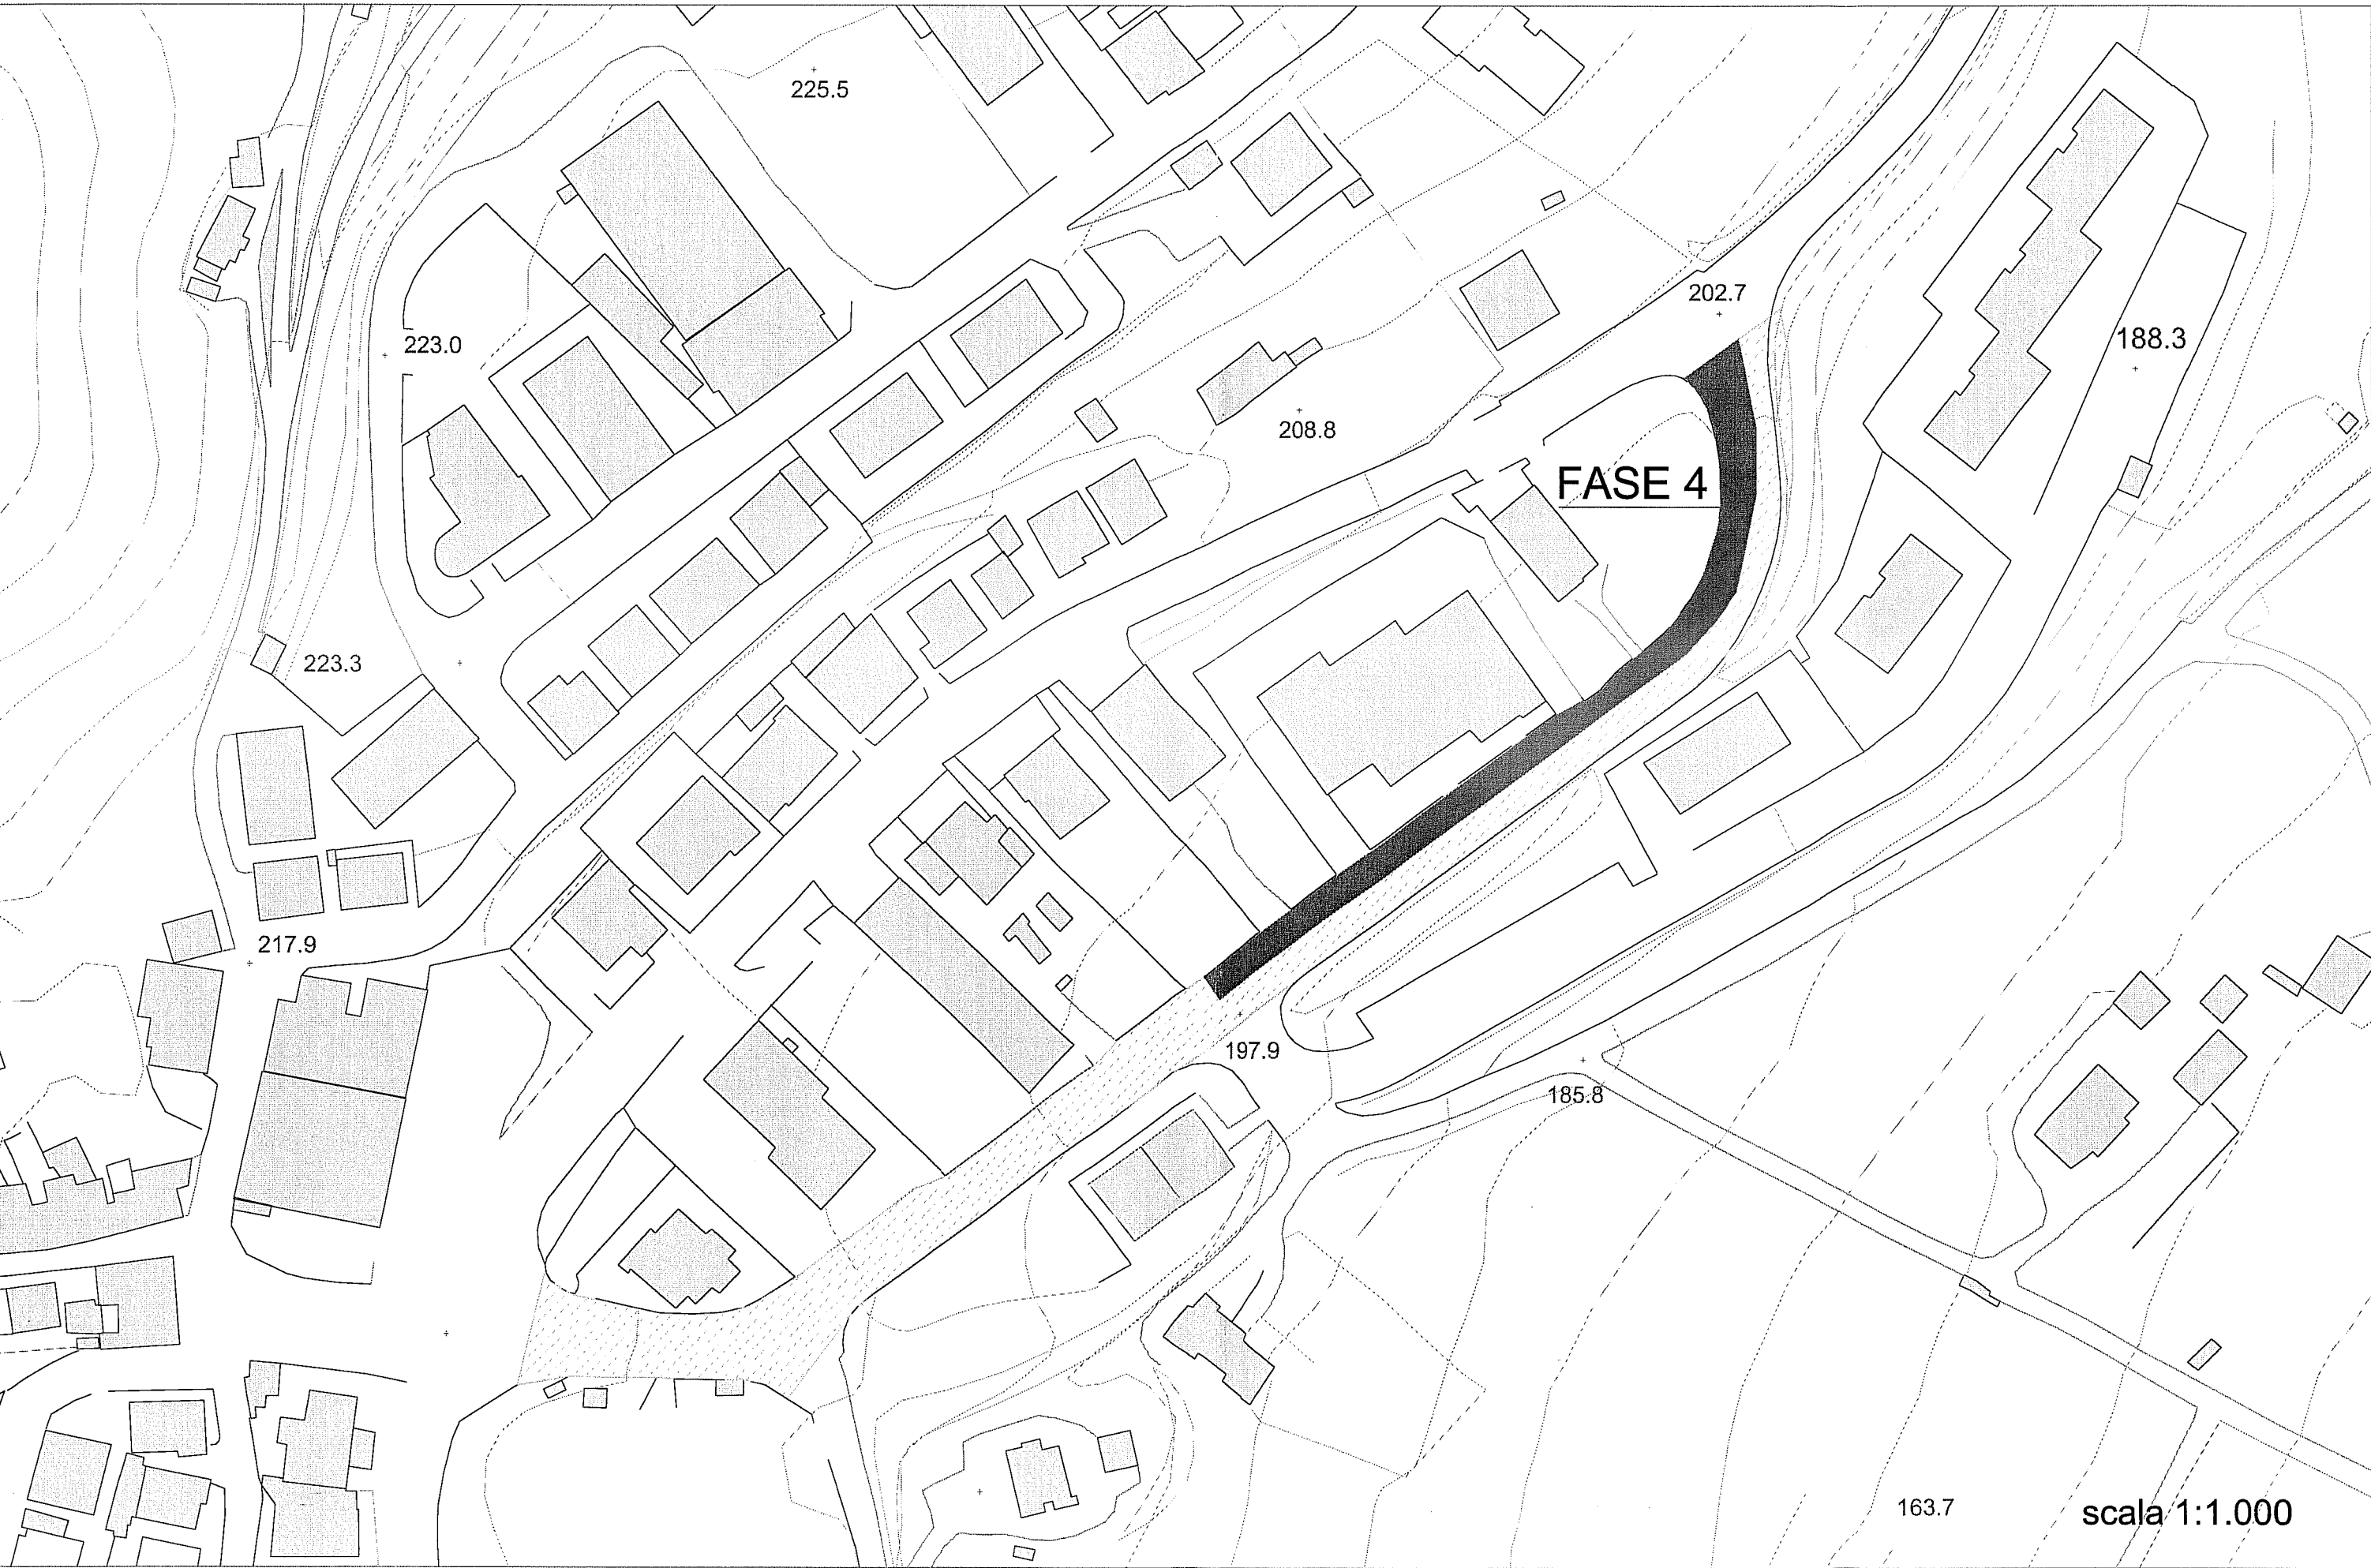


FASE 1

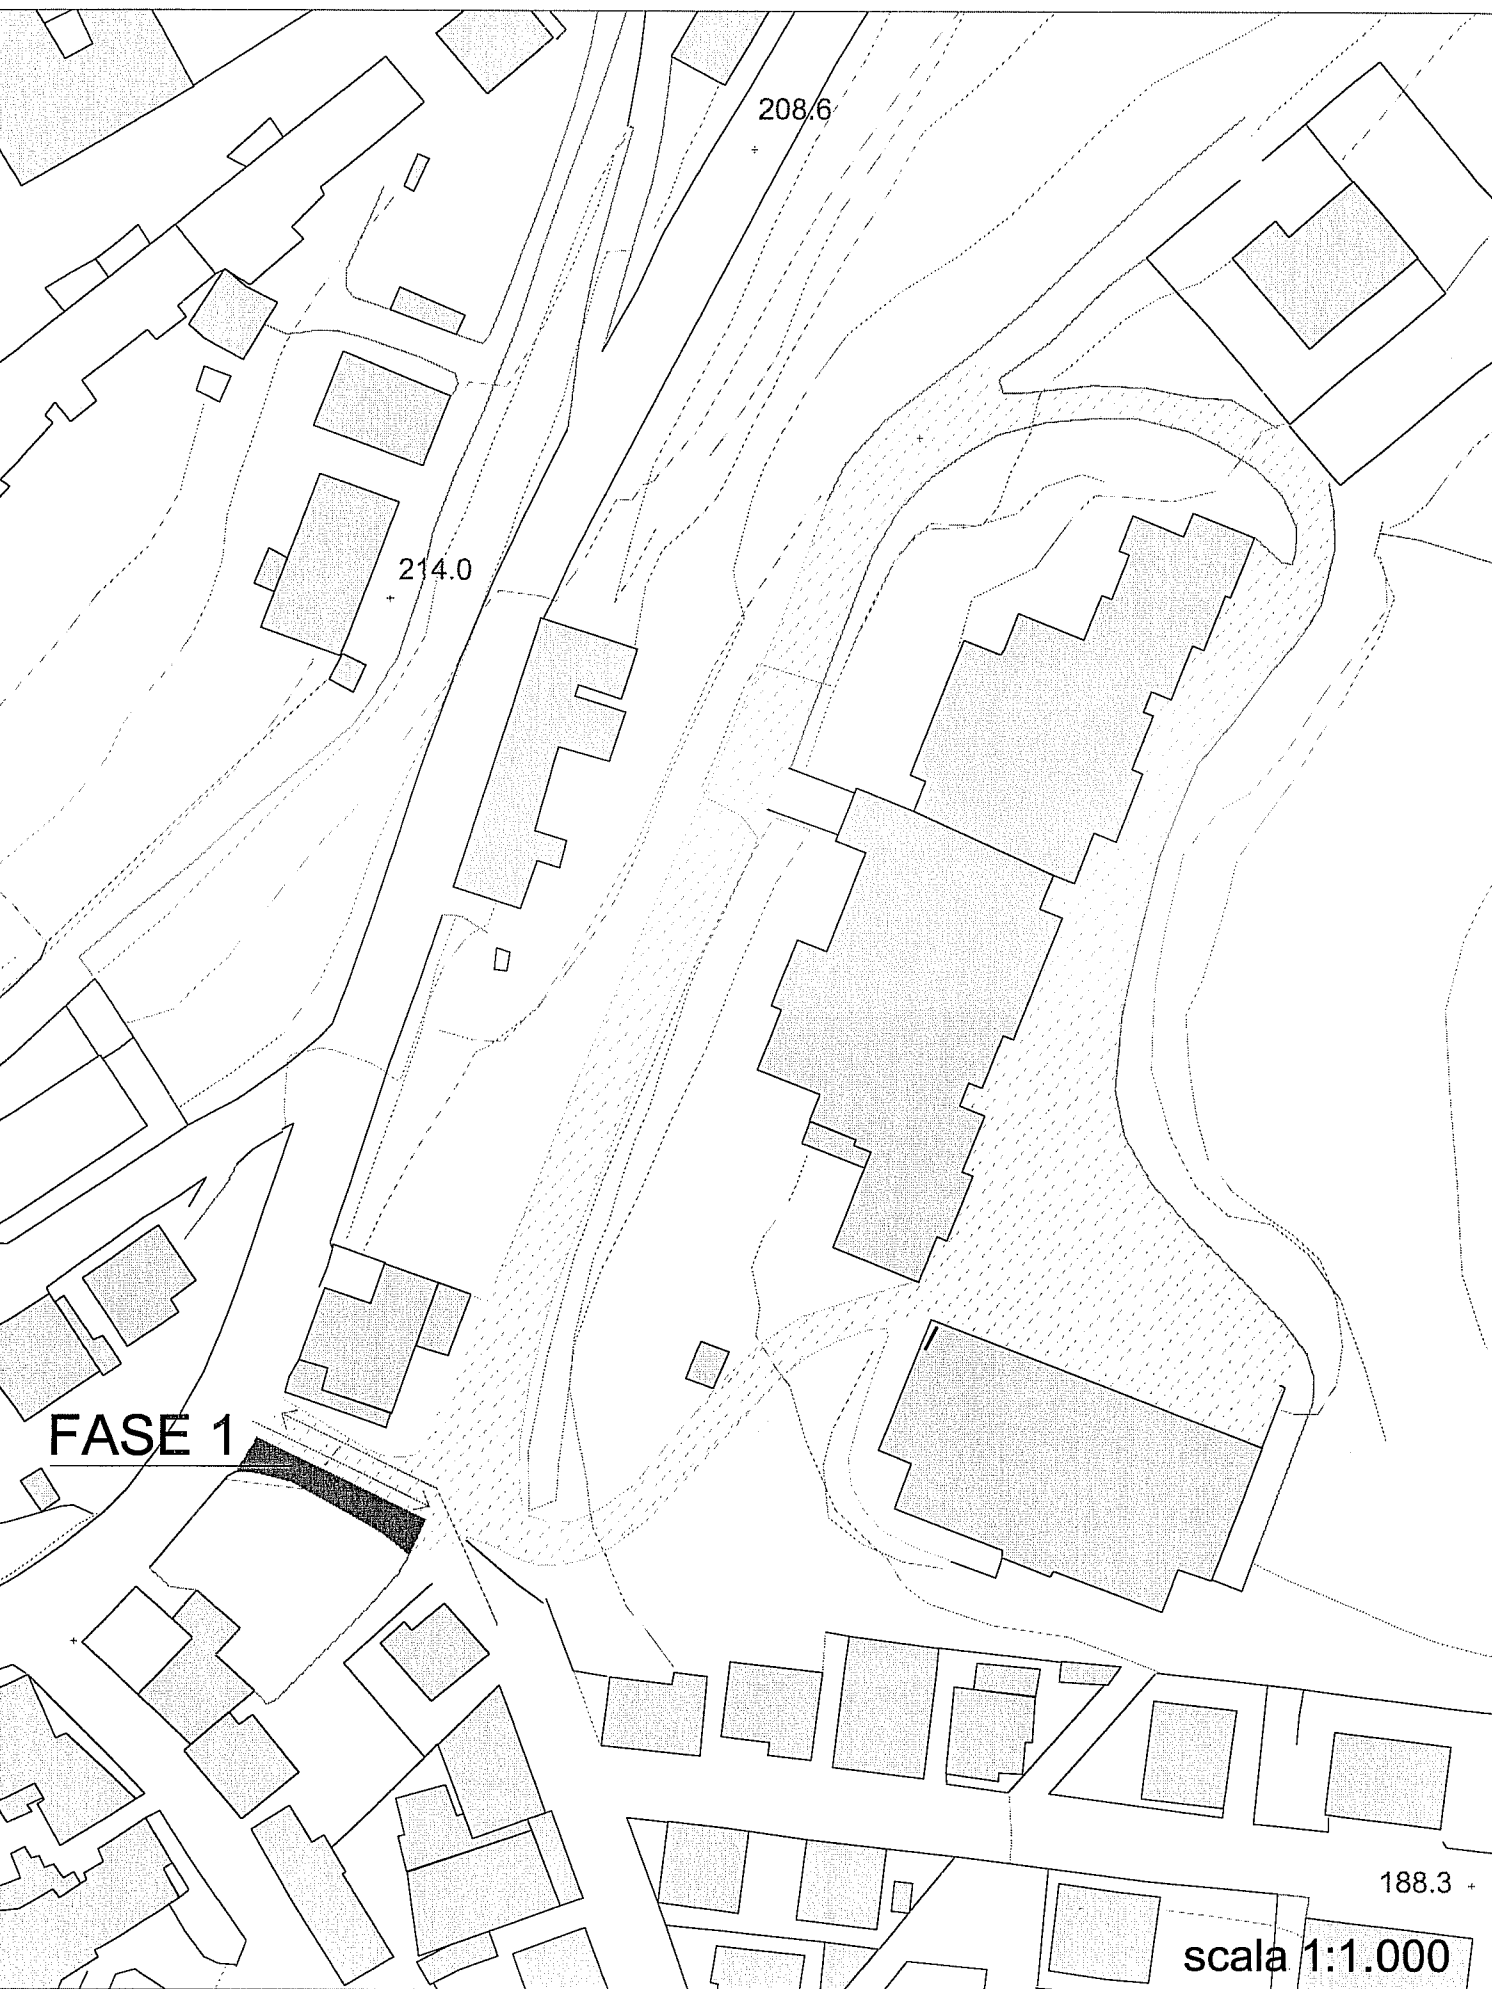


FASE 2

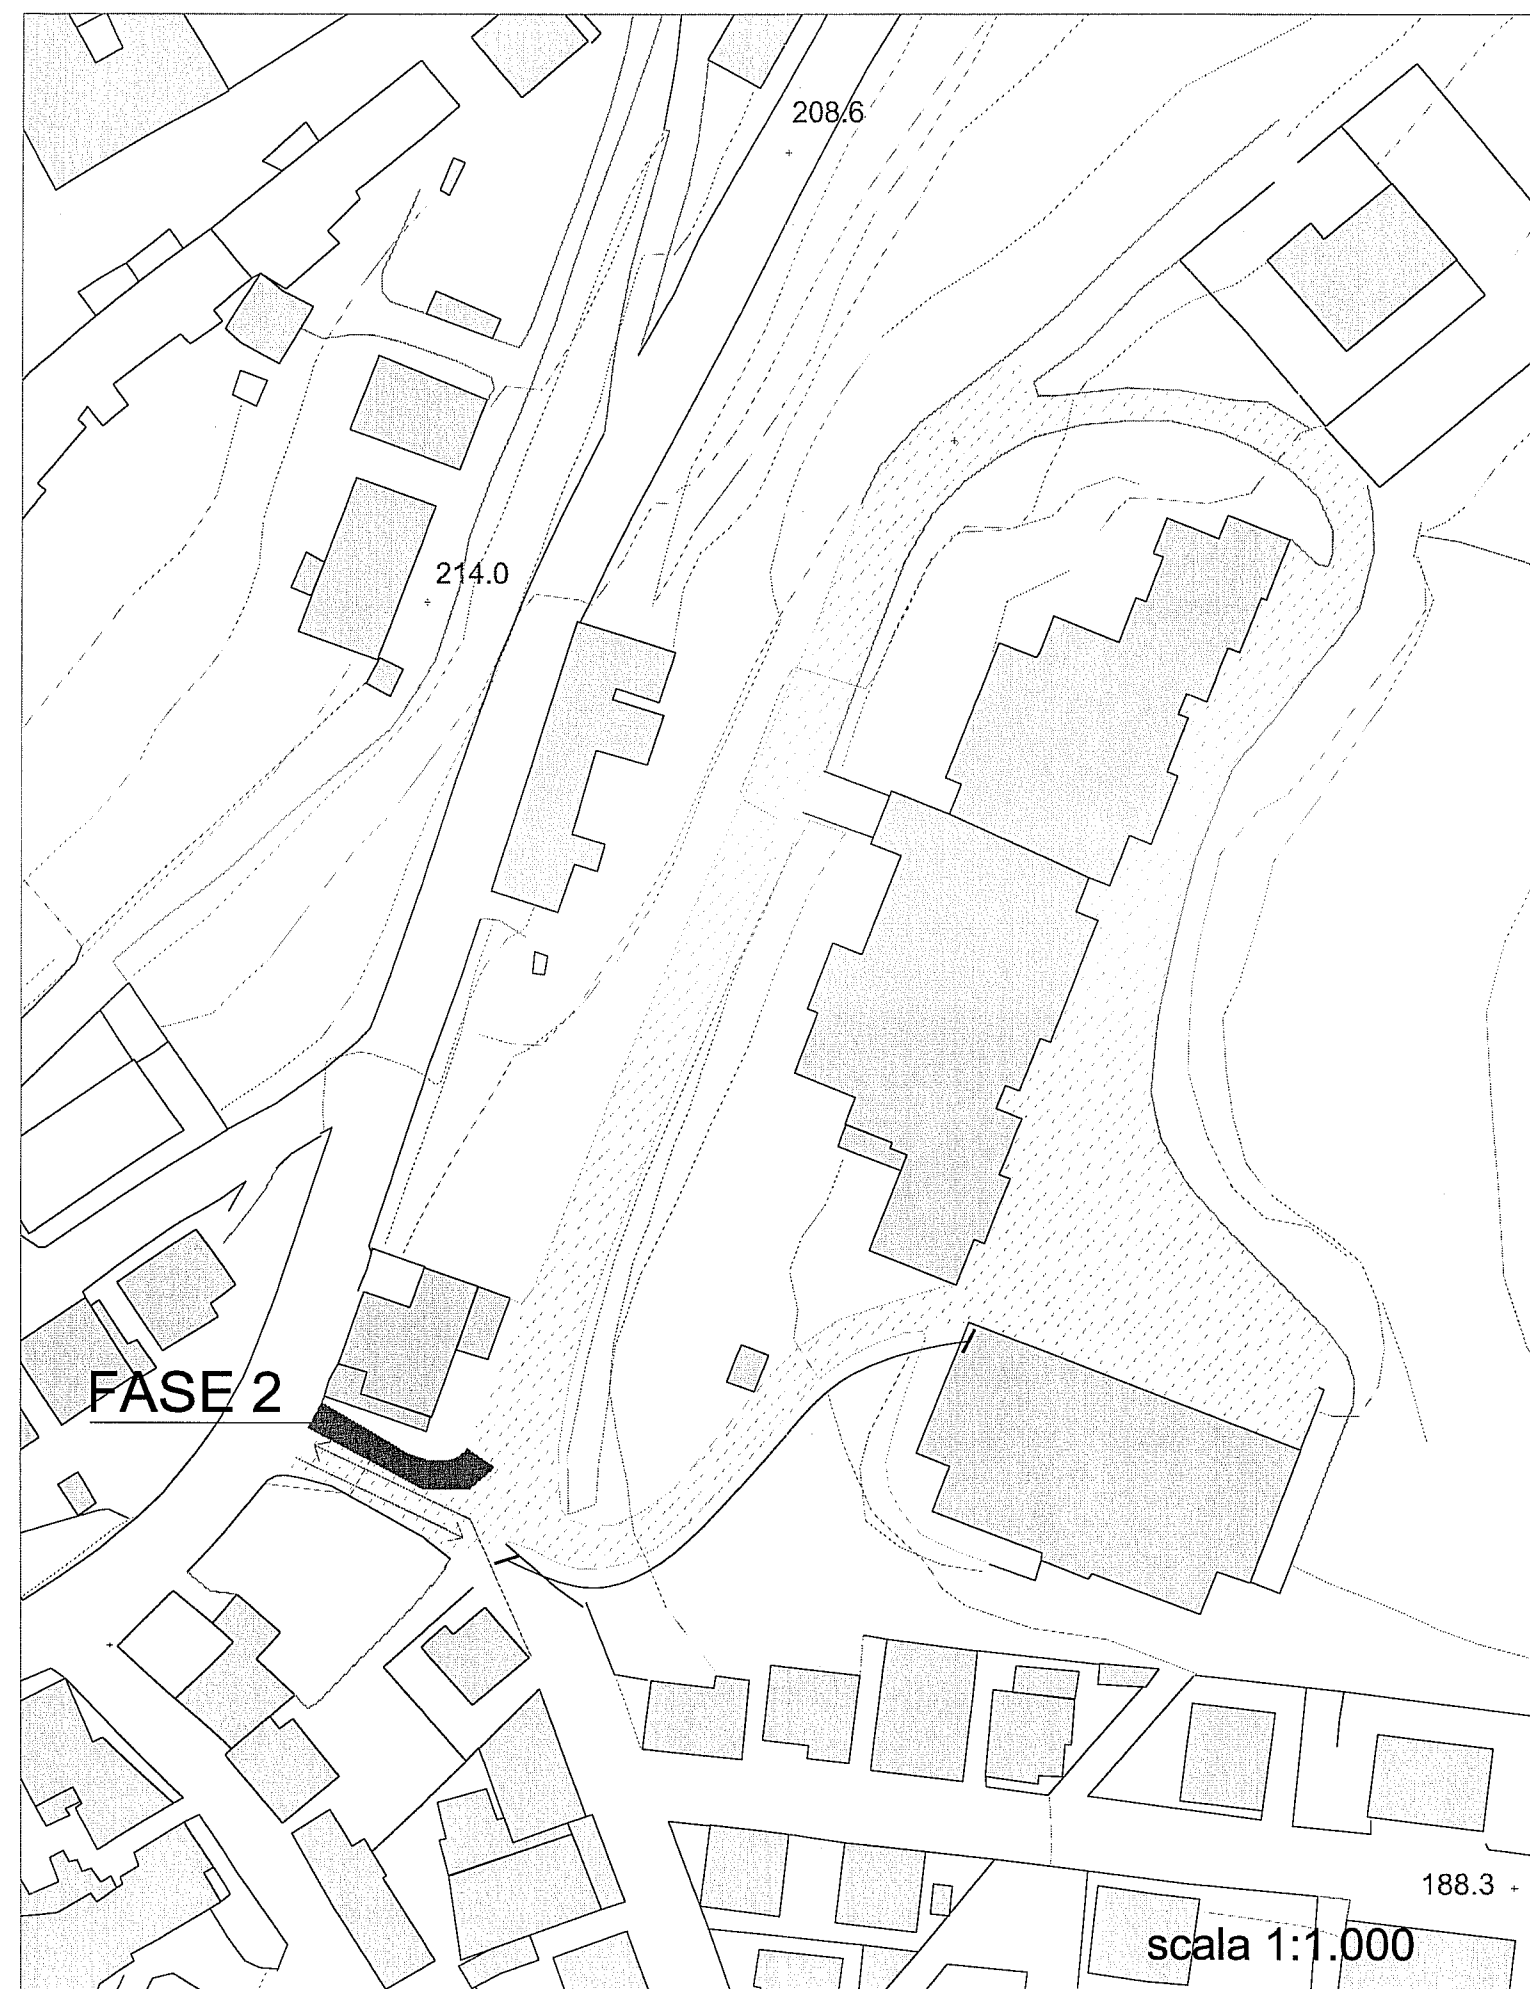


FASE 3

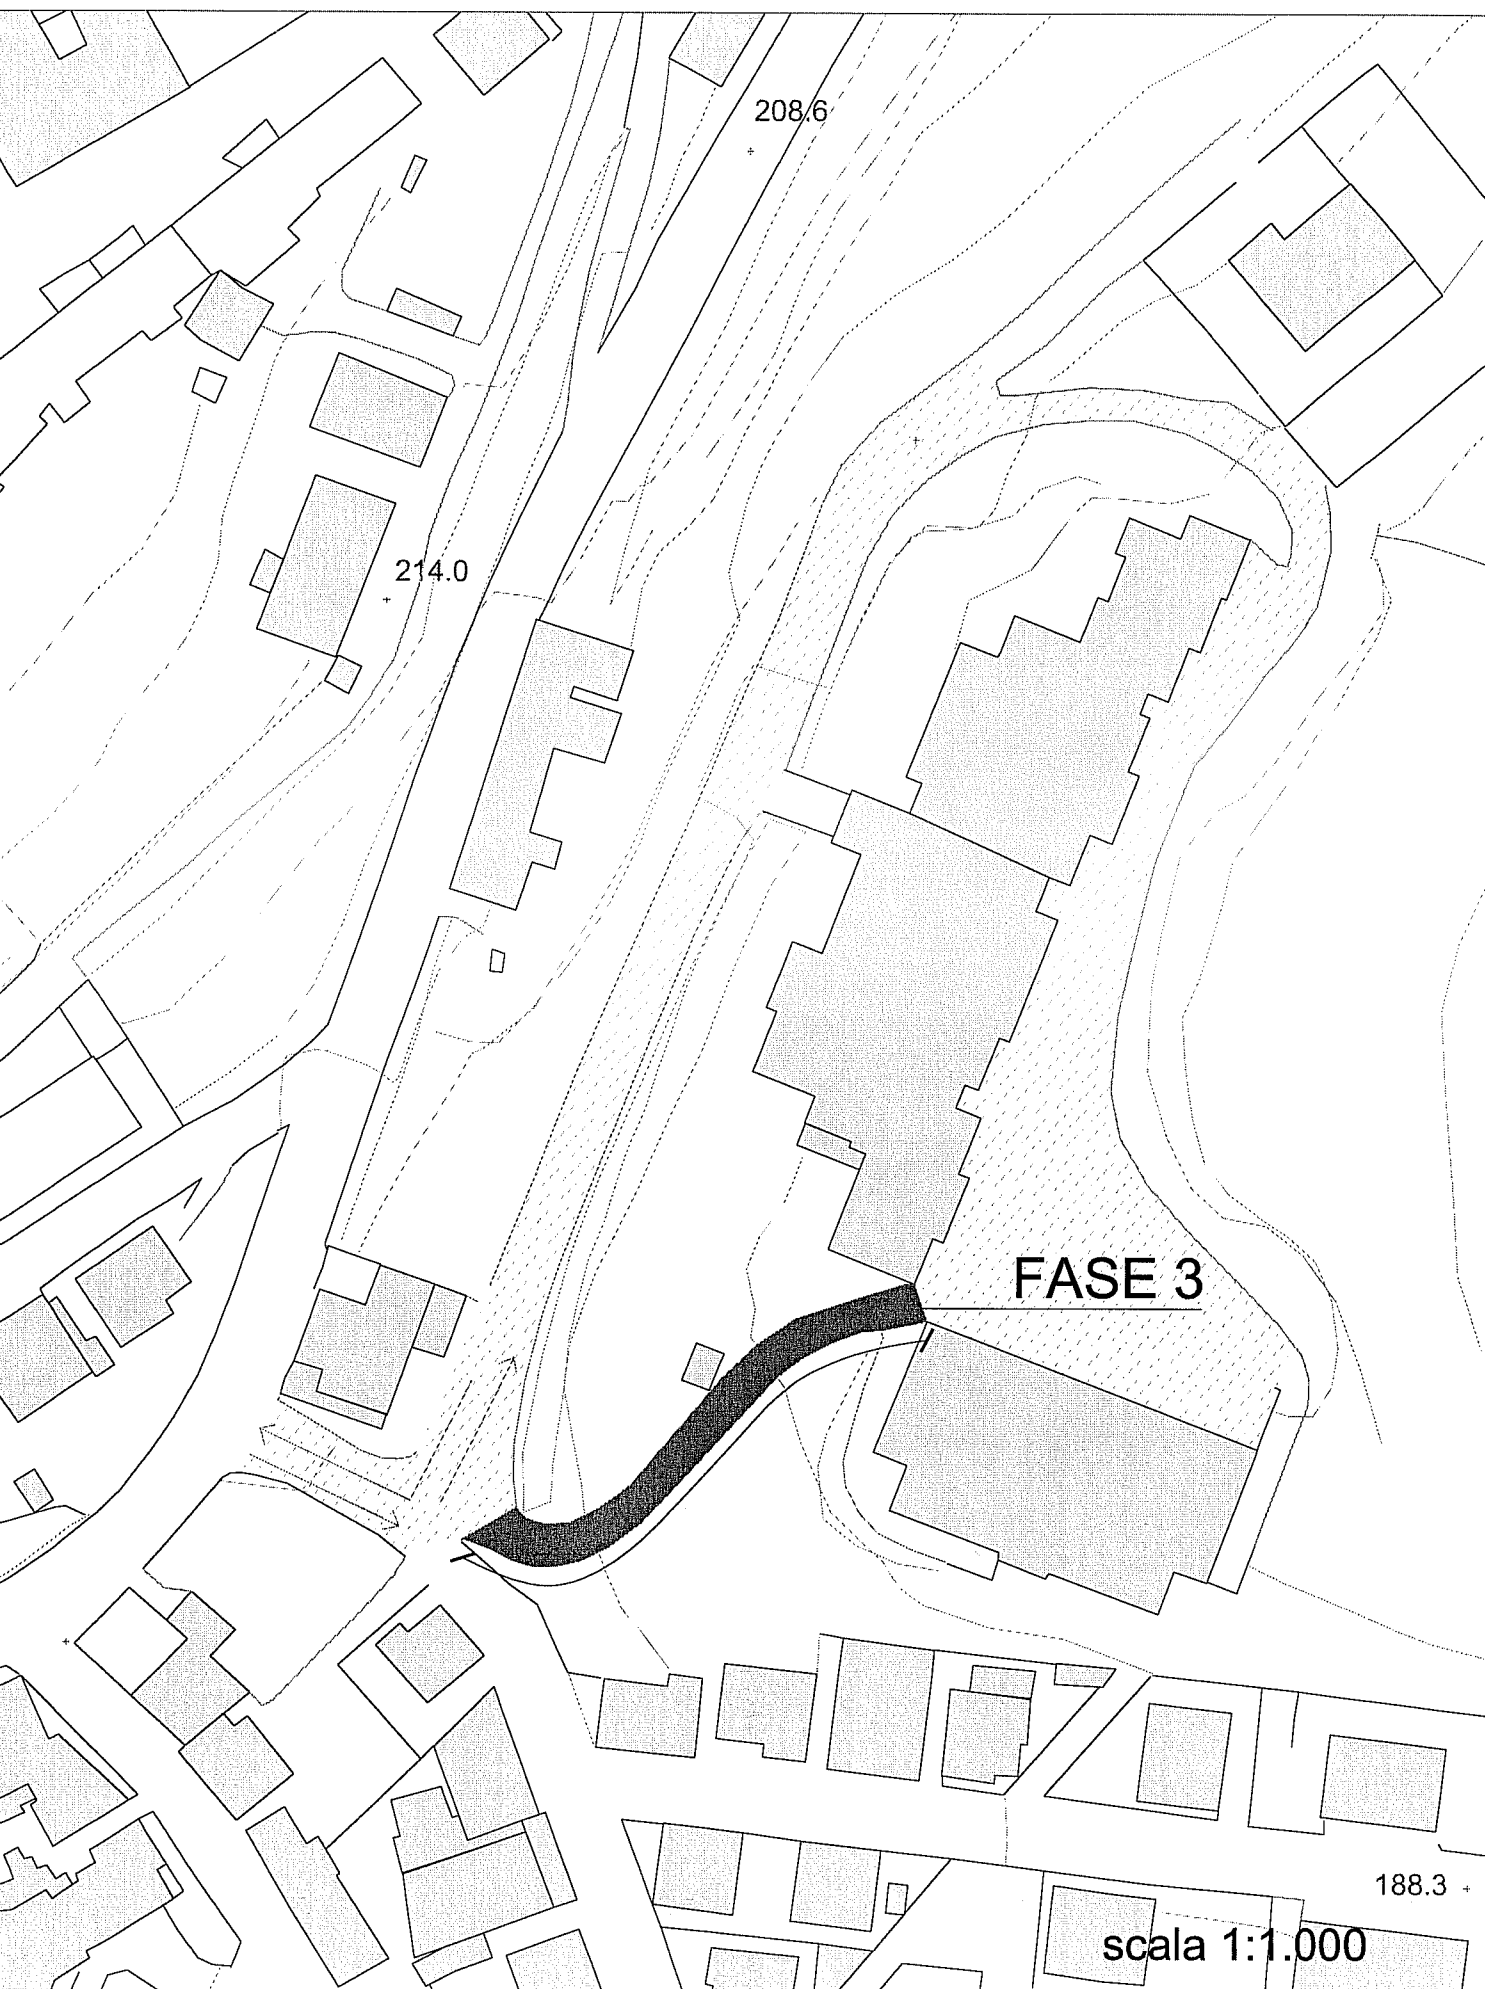

FASE 4

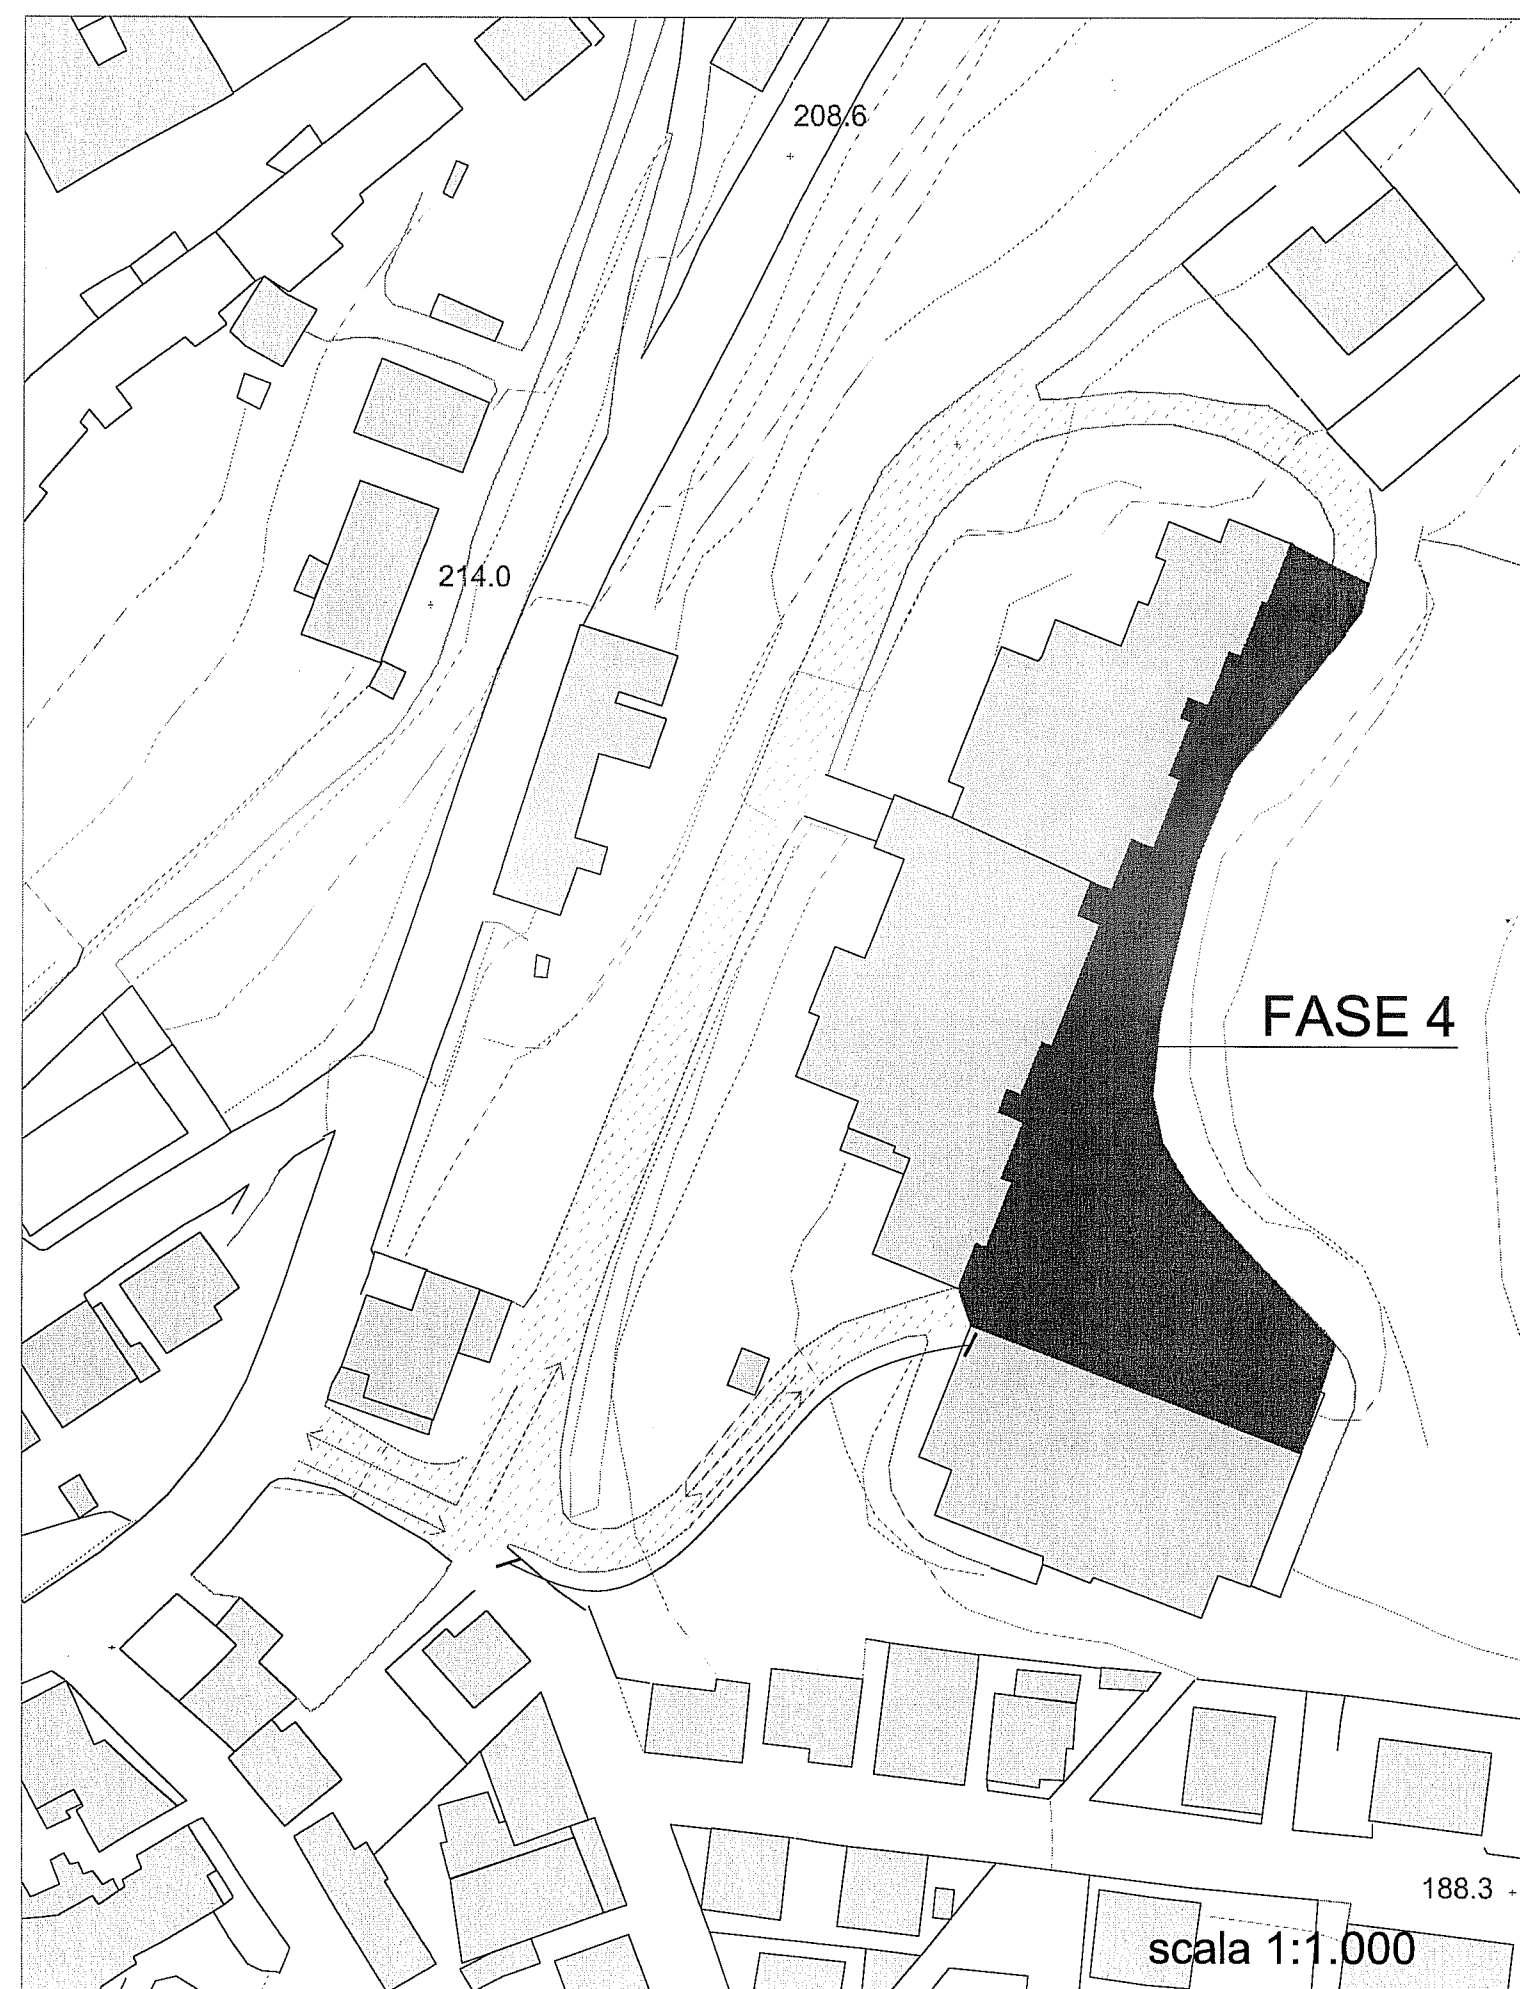

FASE 5

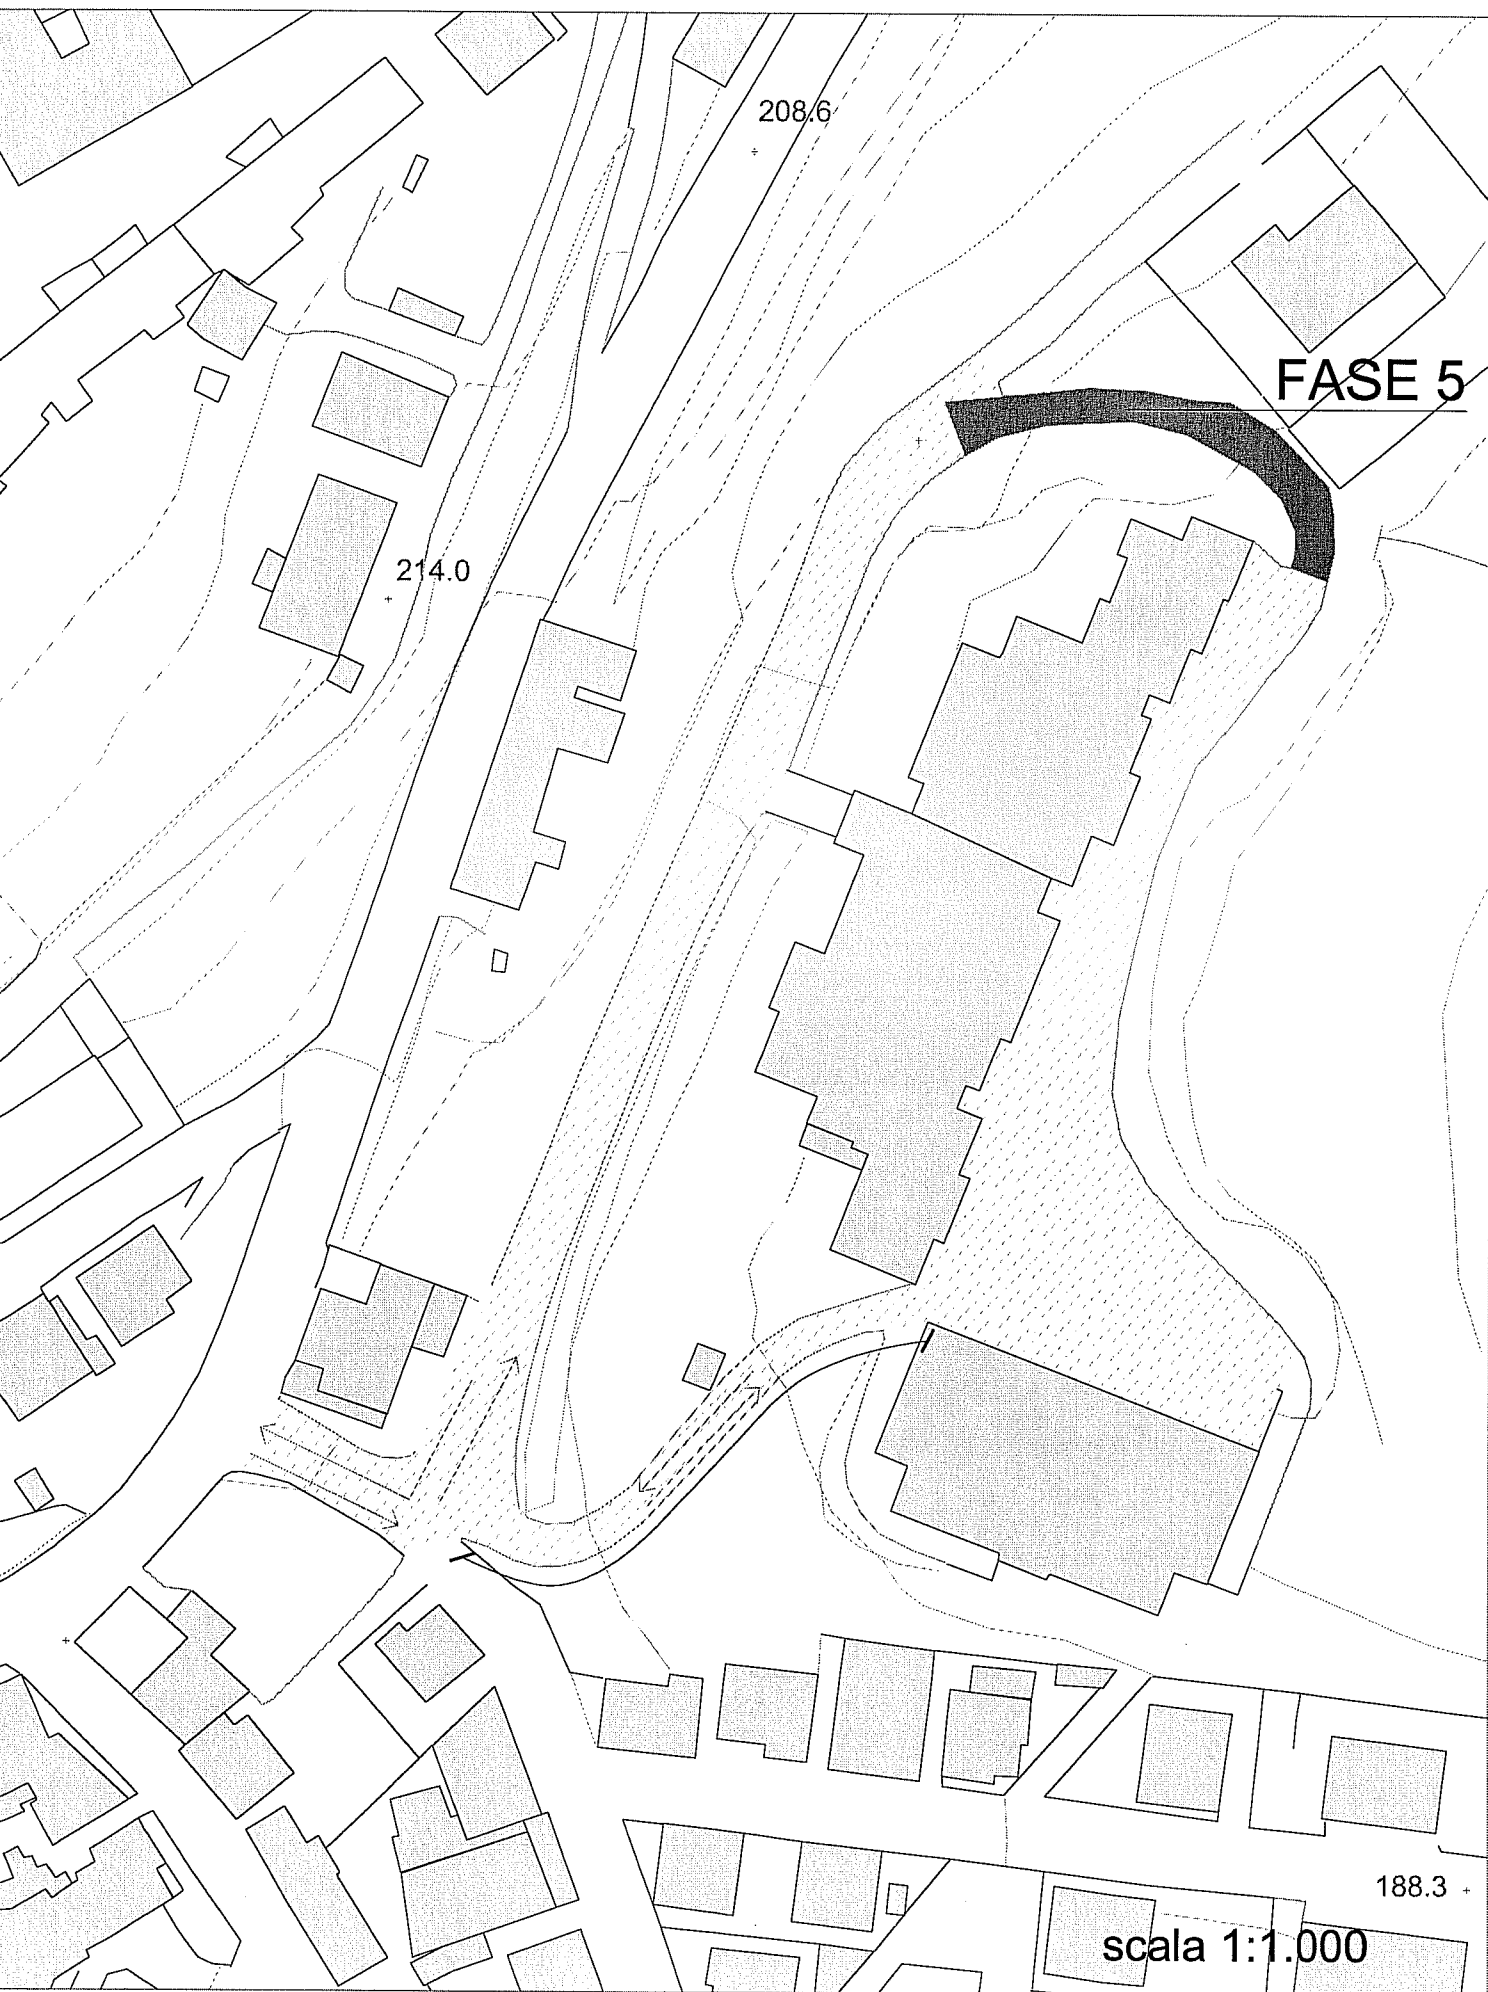

FASE 6

